

完了報告書



OOOOOOA・B棟

着工日 :
完工日 :
作成日 :




株式会社グレロホーム


熊本県合志市豊岡2000-2140

TEL : 0962488676 FAX : 0962013109


シール工事 撤去 作業状況

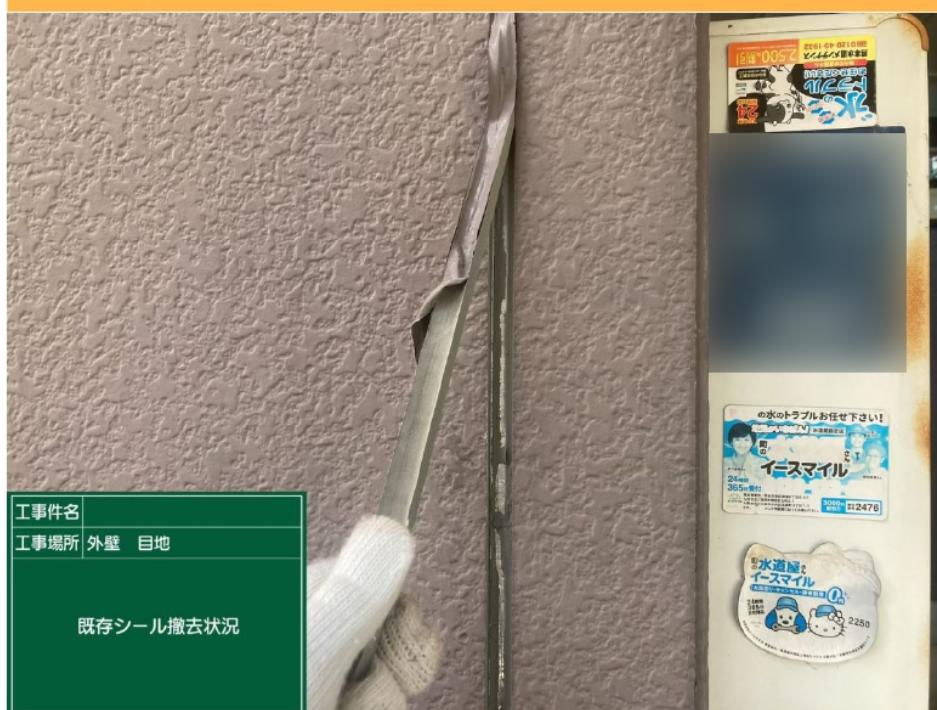


シール工事 プライマー塗布 作業状況

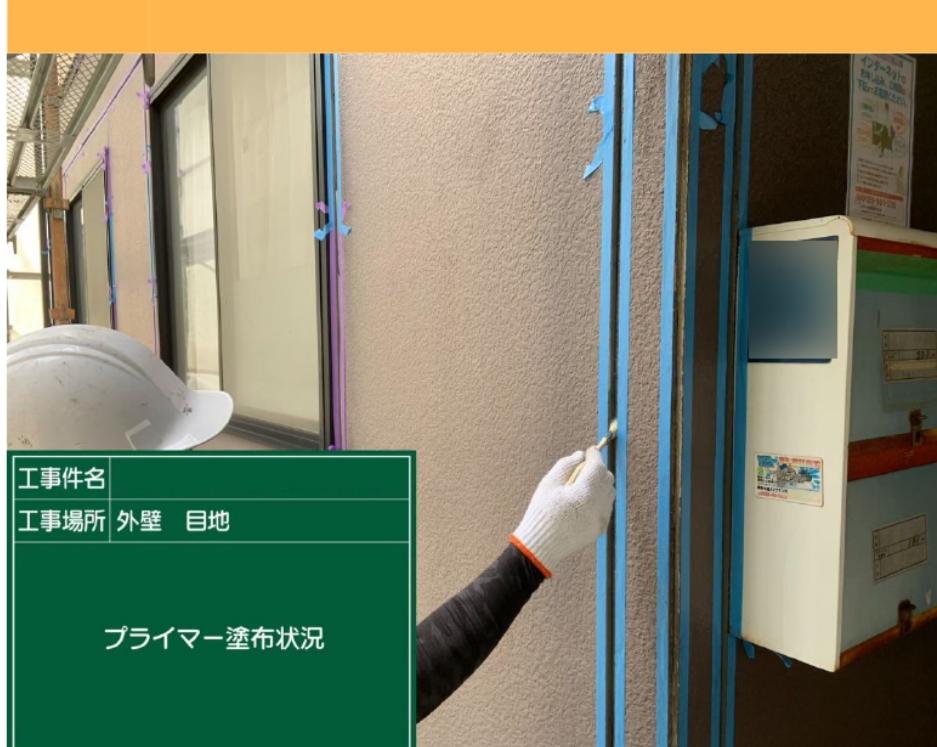

シール充填 作業状況

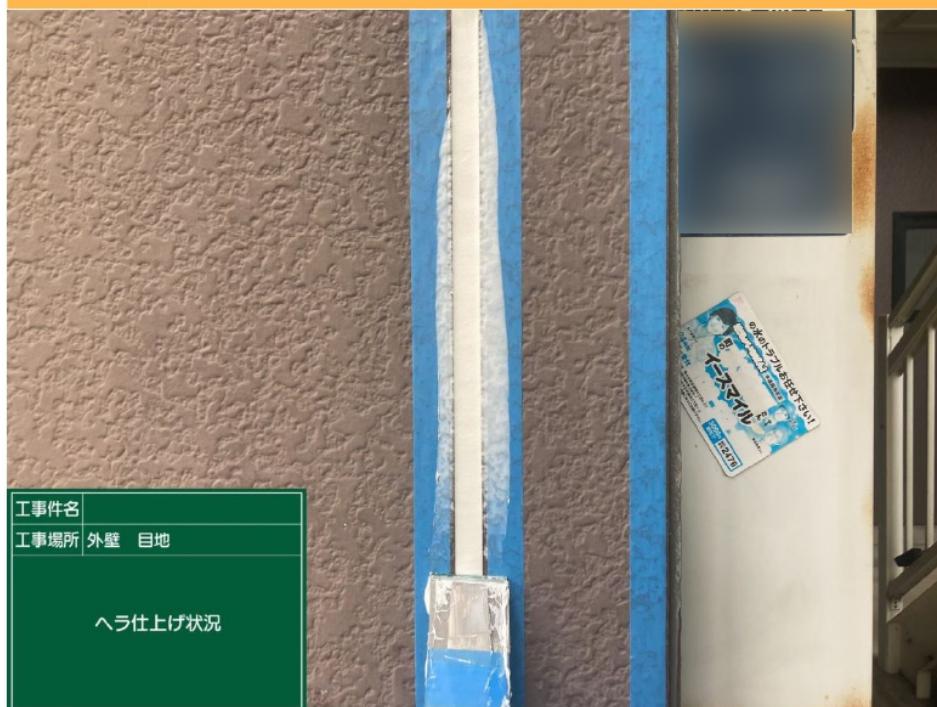

シール工事 作業完了

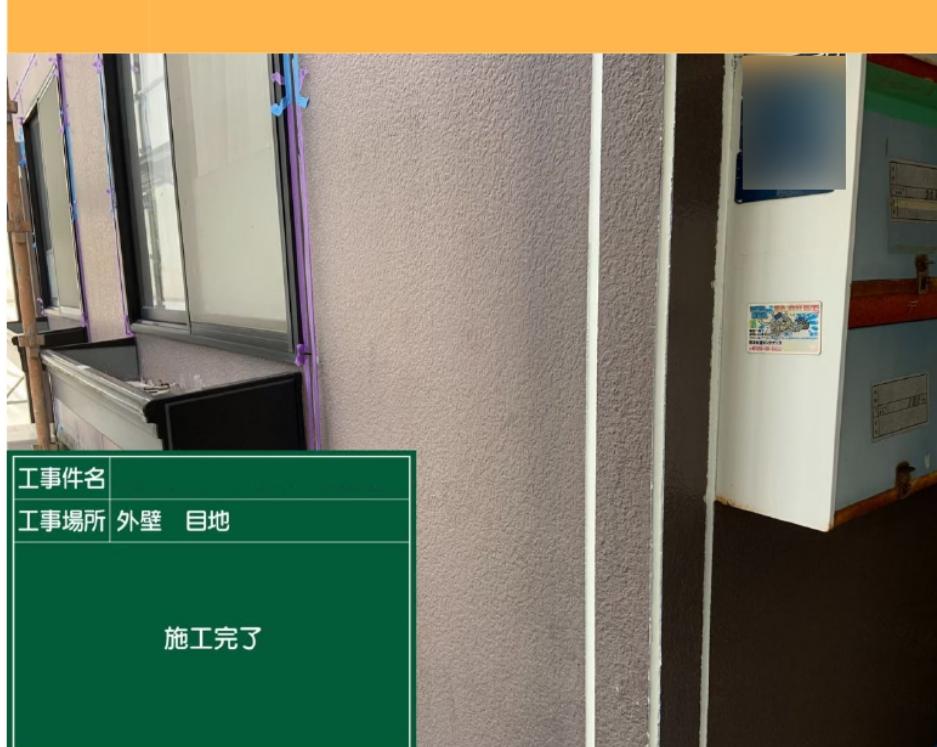

外壁 高圧洗浄 作業状況



外壁 高圧洗浄 作業完了

高圧洗浄が完了しました。



屋根 高圧洗浄 作業状況



屋根 高圧洗浄 作業状況



外壁補修 シーラー塗布 作業状況



塗装前に、下地の状態をチェックして、問題がある箇所の補修をしました。




外壁補修 シーラー塗布 作業完了



シーラー塗布の工程が完了しました。



外壁補修 肌合わせ 作業状況

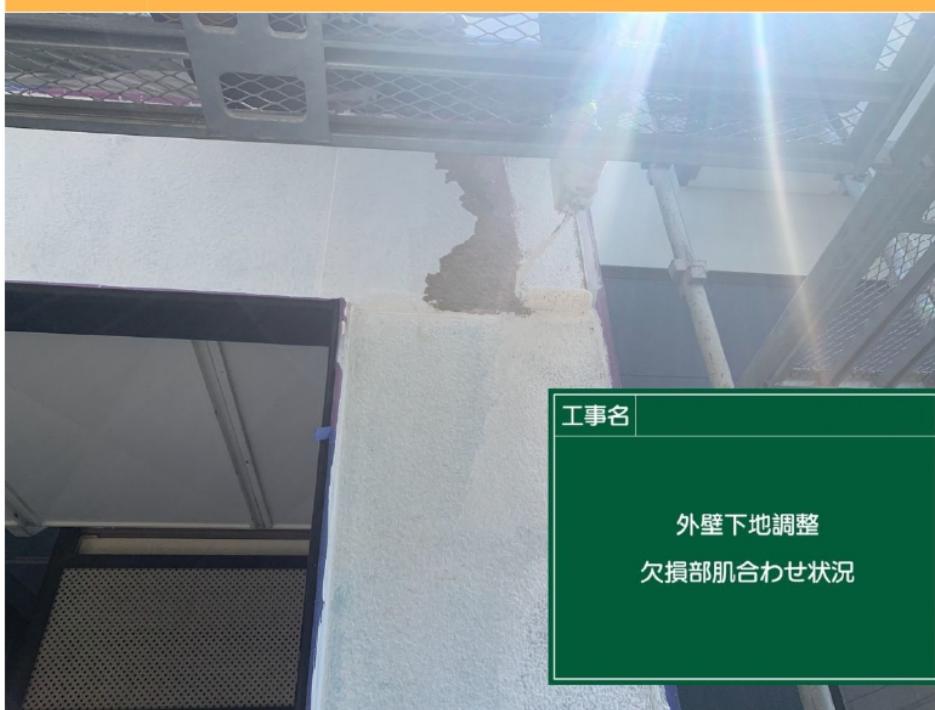

外壁補修 肌合わせ 作業完了




欠陥部肌合わせの工程が完了しました。



外壁 下塗り 作業状況




塗装における最初の工程です。
。下塗り材には、上塗り材との密着を良くする役割があります。

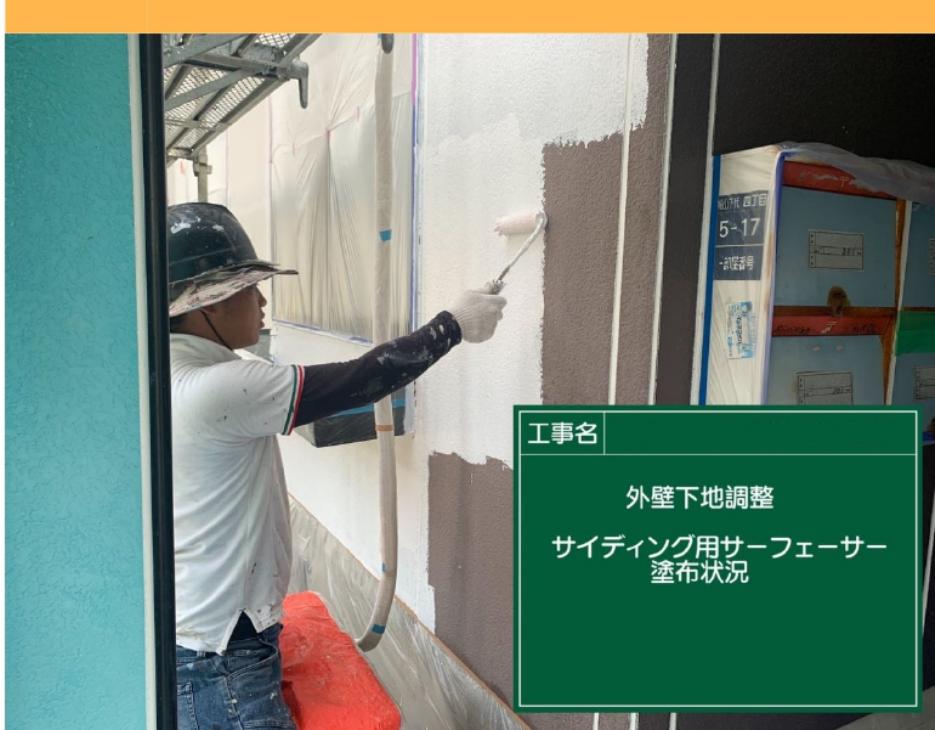

外壁 下塗り 作業完了



外壁下塗りが完了しました。
乾燥後、中塗り工程に移ります。

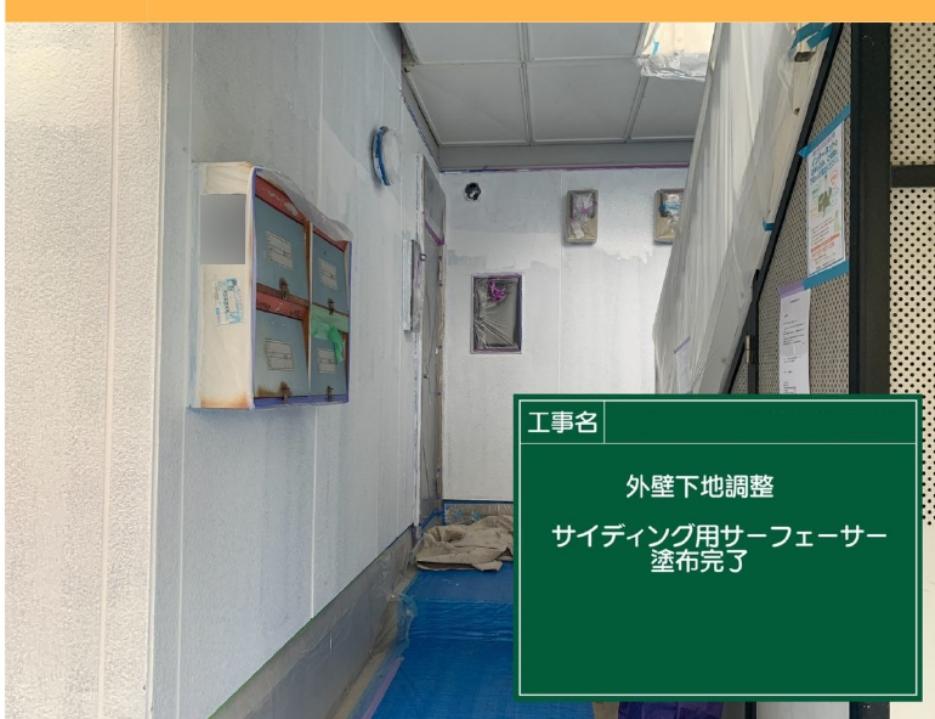

外壁 中塗り 作業状況



上塗り材1回目を塗布する工程です。刷毛・ローラーを使用して塗膜に厚みを持たせます。



外壁 中塗り 作業完了



上塗り1回目の工程が完了しました。



外壁 上塗り 作業状況



上塗り材2回目を塗布する工程です。これで外壁塗装の工程は完了です。



外壁 上塗り 作業完了



上塗り2回目塗布が完了しました。乾燥後、手直し作業を行います。



屋根 下塗り 作業状況




屋根専用の下塗り材を塗布する工程です。白系の材料を使用する事で、遮熱性能を高めることが可能です。



屋根 下塗り 作業完了

屋根下塗りが完了しました。
乾燥後、タスペーサー挿入工
程に移ります。

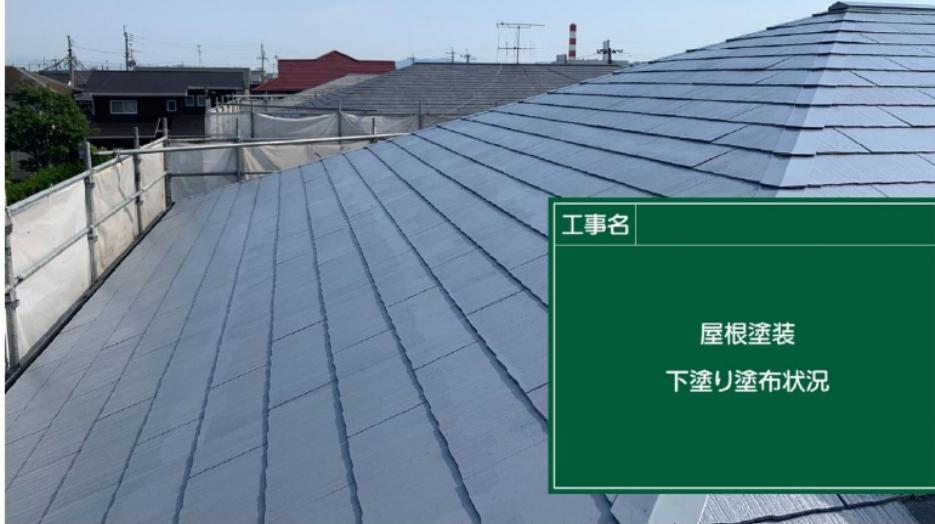


タスペーサー挿入 作業状況



屋根材と屋根材の間に隙間を作る作業を行いました。これにより、雨漏りを防止できます。



タスペーサー挿入 作業完了

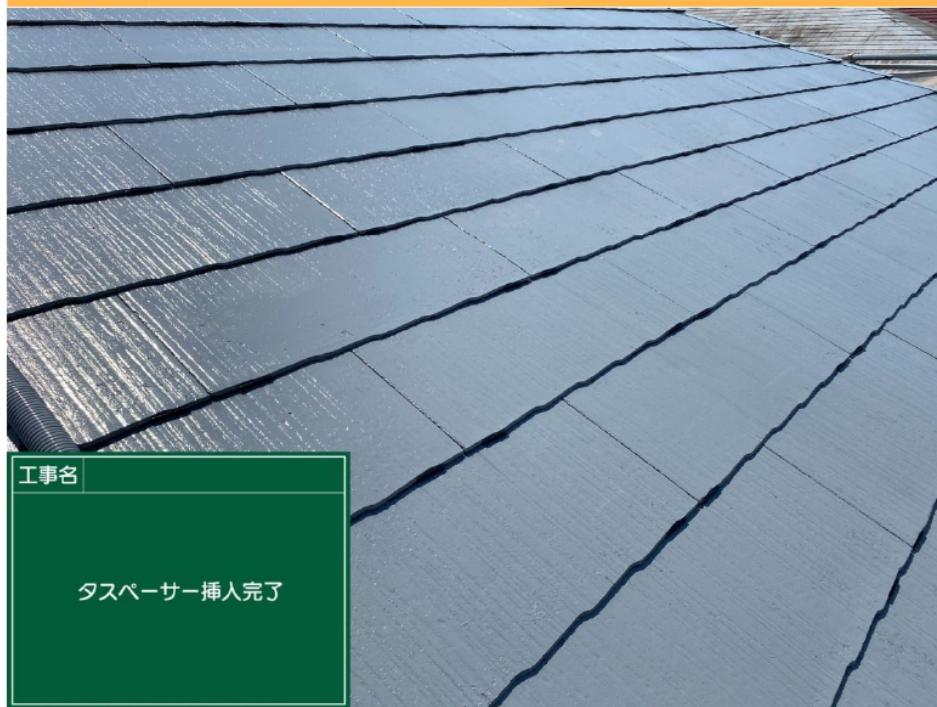

タスペーサー設置が完了しました。中塗り工程に移ります。




屋根 中塗り 作業状況



上塗り材1回目を塗布する工程です。超低汚染・遮熱性に優れた材料を使用しております。



屋根 中塗り 作業完了

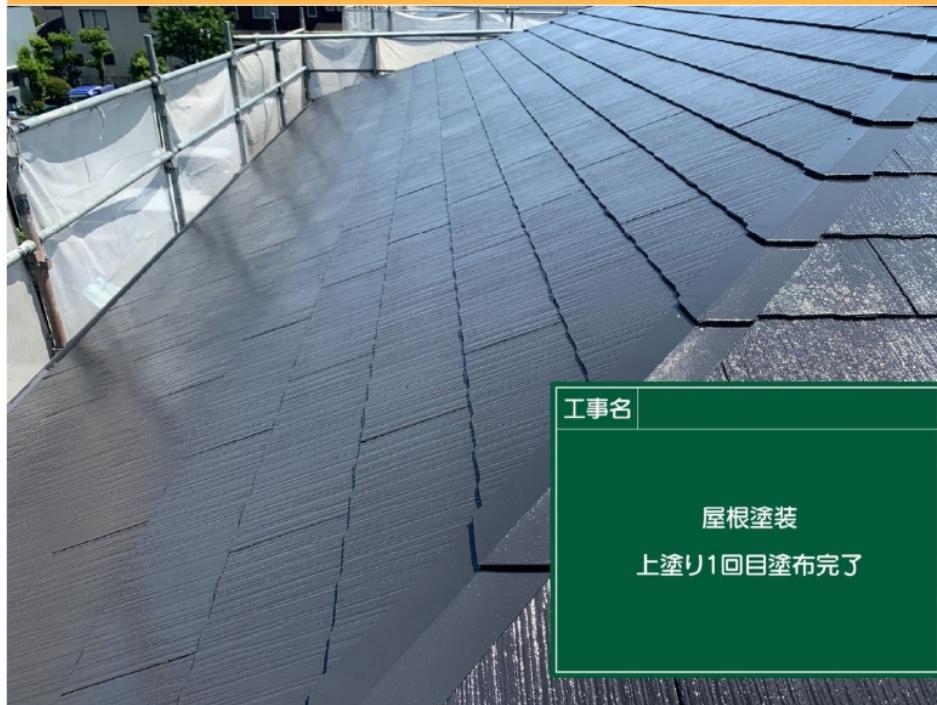

屋根 上塗り 作業状況



屋根 上塗り 作業完了



上塗り2回目塗布の工程が完了しました。



軒天塗装 1回目 作業状況



上塗り材1回目を塗布する工程です。



軒天塗装 1回目 作業完了



上塗り1回目塗布の工程が完了しました。



軒天塗装 2回目 作業状況



上塗り材2回目を塗布する工程。これで軒天塗装の工程は完了です。



軒天塗装 2回目 作業完了



上塗り2回目塗布の工程が完了しました。



鉄部塗装 サビ止め 作業状況

錆を防止・抑制するための工程です。




鉄部塗装 サビ止め 作業完了



サビ止めの工程が完了しました。



鉄部塗装 1回目 作業状況

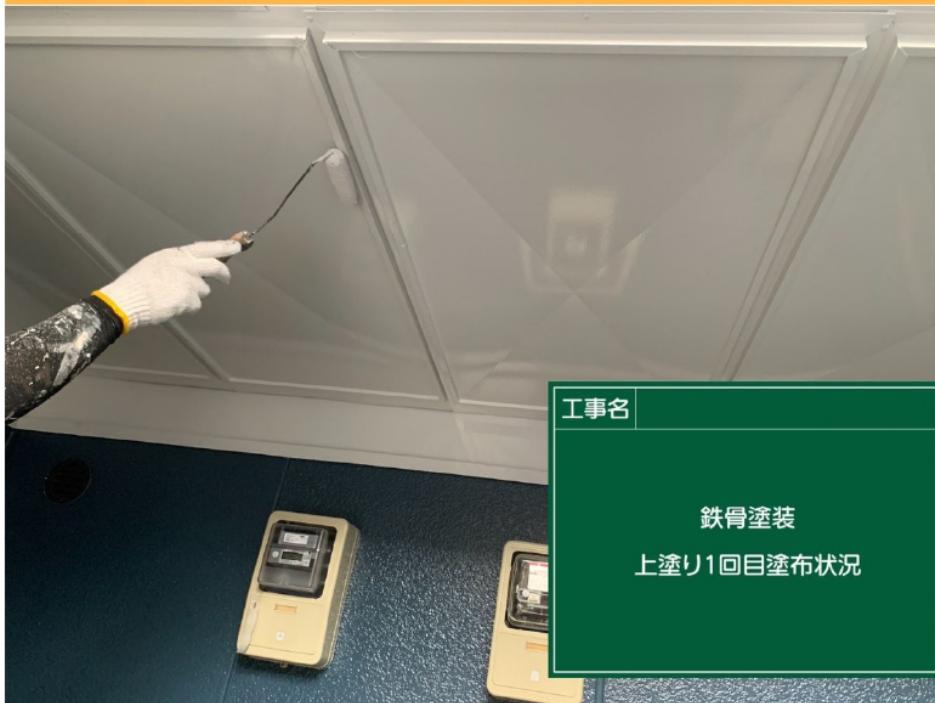

上塗り材1回目を塗布する工程です。



鉄部塗装 1回目 作業完了



上塗り材1回目塗布の工程が
完了しました。



鉄部塗装 2回目 作業状況



上塗り材2回目を塗布する工程です。これで塗装の工程は完了です。



鉄部塗装 2回目 作業完了

上塗り材2回目塗布の工程が
完了しました。



施工前

施工前の状態です。



施工後



全ての作業工程が完了致しました。

